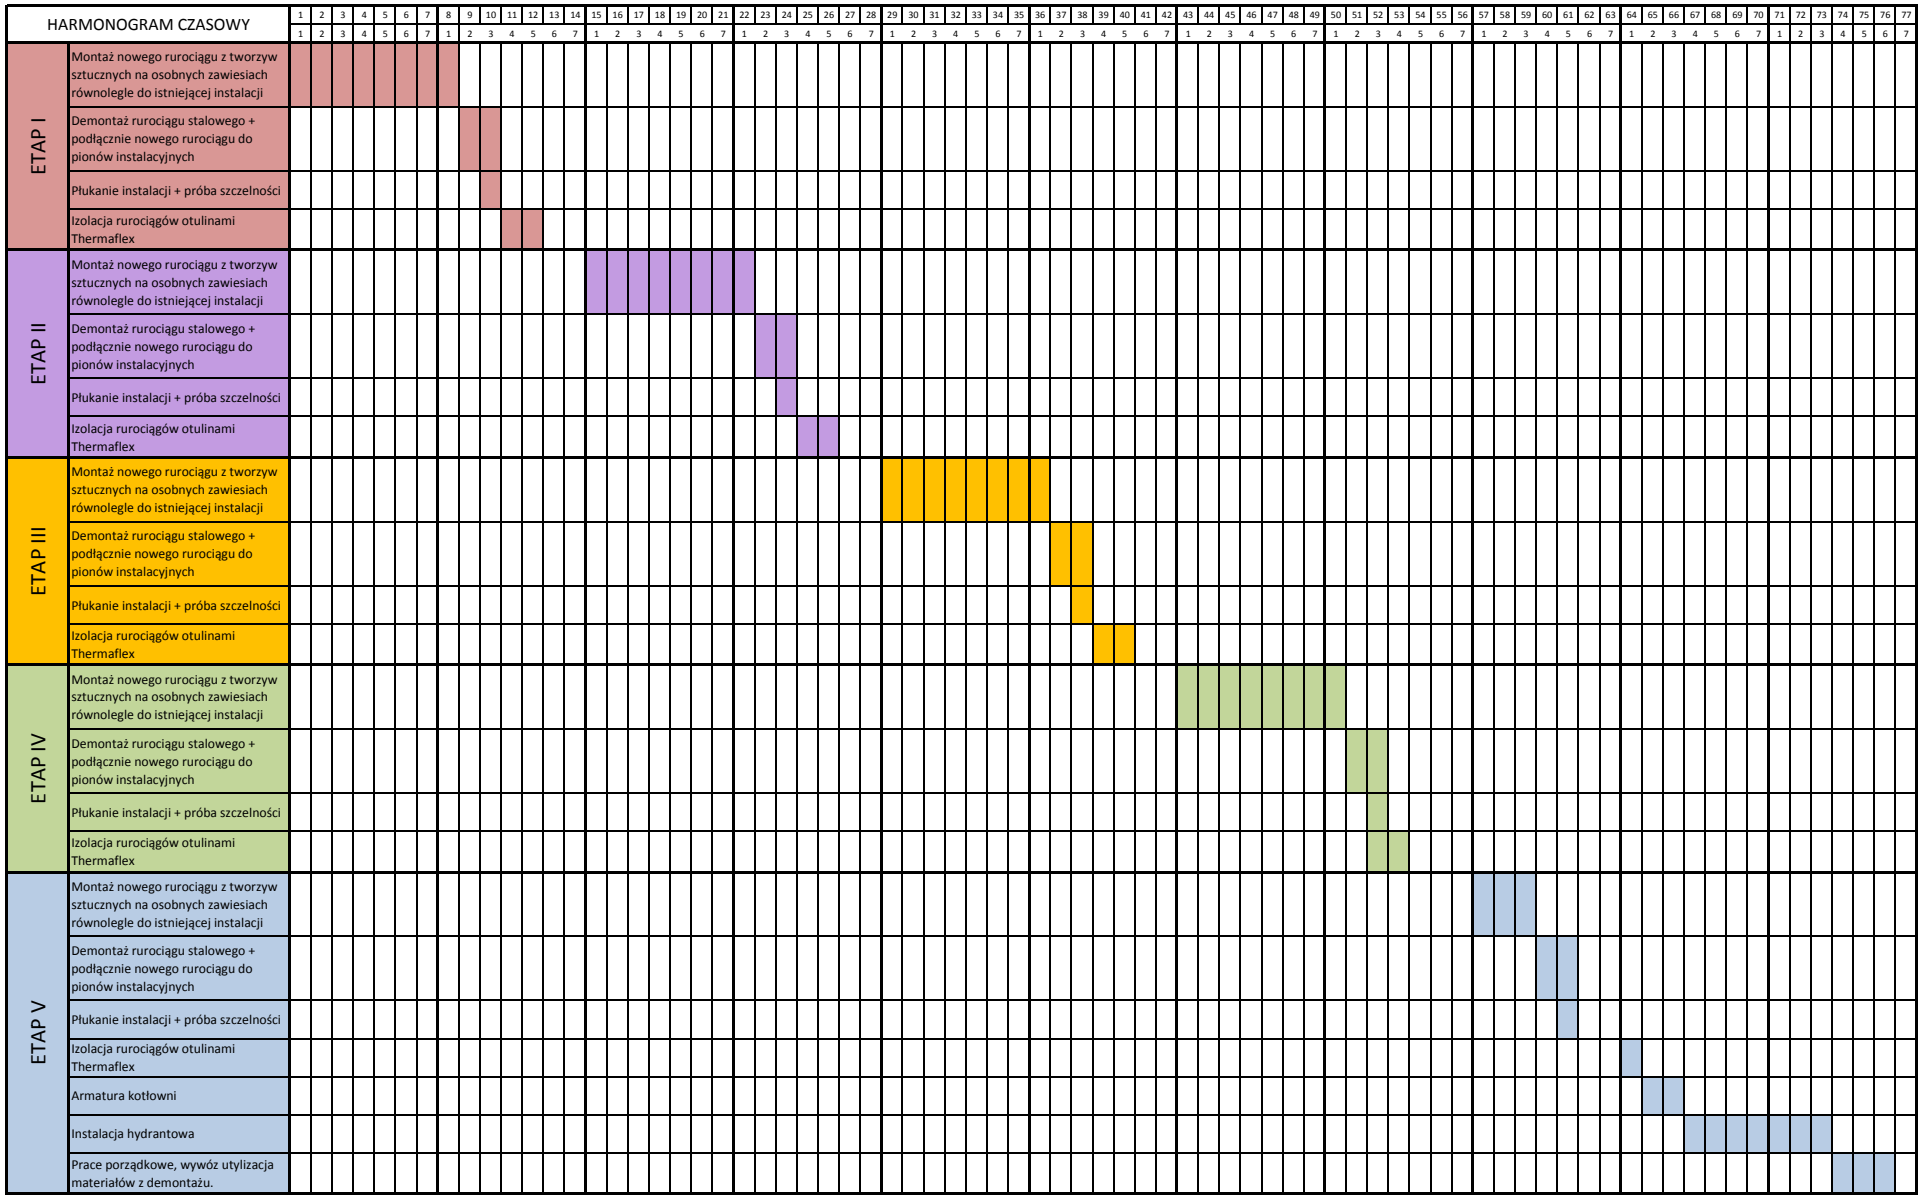
HARMONOGRAM CZASOWY
ETAP I
Montaż nowego rurociągu z tworzyw sztucznych na osobnych zawiesiach równolegle do istniejącej instalacji
Demontaż rurociągu stalowego + podłącznie nowego rurociągu do pionów instalacyjnych
Płukanie instalacji + próba szczelności
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex
ETAP II
Montaż nowego rurociągu z tworzyw sztucznych na osobnych zawiesiach równolegle do istniejącej instalacji
Demontaż rurociągu stalowego + podłącznie nowego rurociągu do pionów instalacyjnych
Płukanie instalacji + próba szczelności
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex
ETAP III
Montaż nowego rurociągu z tworzyw sztucznych na osobnych zawiesiach równolegle do istniejącej instalacji
Demontaż rurociągu stalowego + podłącznie nowego rurociągu do pionów instalacyjnych
Płukanie instalacji + próba szczelności
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex
ETAP IV
Montaż nowego rurociągu z tworzyw sztucznych na osobnych zawiesiach równolegle do istniejącej instalacji
Demontaż rurociągu stalowego + podłącznie nowego rurociągu do pionów instalacyjnych
Płukanie instalacji + próba szczelności
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex
ETAP V
Montaż nowego rurociągu z tworzyw sztucznych na osobnych zawiesiach równolegle do istniejącej instalacji
Demontaż rurociągu stalowego + podłącznie nowego rurociągu do pionów instalacyjnych
Płukanie instalacji + próba szczelności
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex
Armatura kotłowni
Instalacja hydrantowa
Prace porządkowe, wywóz utylizacja materiałów z demontażu.
